Laporan Status Kerja Mingguan

Minggu 02 | Per 9 Oktober 2026 | Disiapkan oleh Cerdas Inovasi Digital

DATA SINTETIS
bukan data klien

Ringkasan eksekutif

Per 9 Oktober 2026, 64 tugas dipantau pada 5 proyek: **33 selesai** (52%), 16 berjalan sesuai rencana, 2 berisiko, 3 terlambat, dan 10 belum dimulai. Rata-rata kemajuan seluruh tugas 65%.

Minggu ini 7 tugas diselesaikan; jumlah tugas selesai naik 8 dibanding minggu lalu. Tugas yang baru masuk daftar terlambat: 2 (T-050, T-052); 4 tugas baru ditambahkan.

Proyek dengan kemajuan terendah: **Penataan Infrastruktur Jaringan** (35%). **4 butir** membutuhkan keputusan pimpinan (lihat halaman 2).

SELESAI	BERJALAN	BERISIKO	TERLAMBAT
33	**16**	**2**	**3**
52% dari 64 tugas	sesuai rencana	tertahan / tenggat dekat	lewat tenggat
naik 8 dari minggu lalu	**naik 3 dari minggu lalu**	**turun 1 dari minggu lalu**	**turun 1 dari minggu lalu**

Kemajuan per proyek

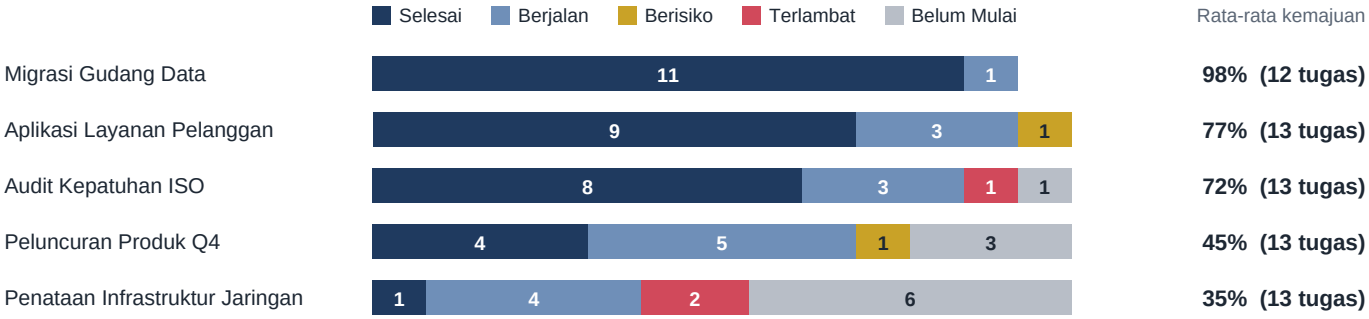

Panjang batang = jumlah tugas per status. Berisiko = tertahan, atau tenggat dalam 7 hari dengan kemajuan di bawah 50%. Terlambat = lewat tenggat dan belum selesai.

Capaian minggu ini (7 tugas selesai dalam 7 hari terakhir)

ID	Tugas	Proyek	Pemilik	Selesai	Catatan penyelesaian
T-010	Latih tim analis di sistem baru	Migrasi Gudang Data	Budi Santoso	09/10/26	Selesai; catatan perbaikan kecil sudah ditutup.
T-012	Dokumentasi kamus data	Migrasi Gudang Data	Siti Rahmawati	07/10/26	Selesai; catatan perbaikan kecil sudah ditutup.
T-020	Perbaiki temuan uji tahap 1	Aplikasi Layanan Pelang...	Dewi Lestari	06/10/26	Selesai sesuai lingkup; dokumen serah terima sudah diarsipkan.
T-031	Tinjau ulang prosedur pengadaan	Audit Kepatuhan ISO	Maya Kusuma	06/10/26	Hasil diserahkan, tidak ada temuan terbuka.
T-032	Perbarui matriks risiko	Audit Kepatuhan ISO	Maya Kusuma	06/10/26	Selesai; catatan perbaikan kecil sudah ditutup.
T-021	Susun panduan pengguna	Aplikasi Layanan Pelang...	Siti Rahmawati	05/10/26	Hasil diserahkan, tidak ada temuan terbuka.
T-033	Rapat tinjauan manajemen	Audit Kepatuhan ISO	Rizky Hidayat	05/10/26	Hasil diserahkan, tidak ada temuan terbuka.

Beban kerja per pemilik

Pemilik	Total tugas	Selesai	Masih terbuka	Berisiko / terlambat	Porsi selesai
Budi Santoso	18	6	12	2	33%
Rizky Hidayat	14	9	5	2	64%
Dewi Lestari	11	6	5	-	55%
Siti Rahmawati	10	6	4	-	60%
Andi Pratama	5	2	3	1	40%
Maya Kusuma	6	4	2	-	67%

Pekerjaan sedang berjalan (18 tugas, diurutkan menurut tenggat)

ID	Tugas	Pemilik	Kemajuan	Tenggat	Status
T-011	Matikan server lama bertahap	Siti Rahmawati	75%	10/10/26	Berjalan
T-040	Kontrak pemasok bahan baku	Rizky Hidayat	55%	11/10/26	Berjalan
T-051	Pengadaan perangkat switch	Budi Santoso	85%	11/10/26	Berjalan
T-054	Pasang titik akses nirkabel	Andi Pratama	80%	12/10/26	Berjalan
T-046	Undang mitra distributor	Rizky Hidayat	0%	13/10/26	Berisiko
T-022	Pelatihan petugas layanan	Rizky Hidayat	40%	14/10/26	Berisiko
T-042	Uji mutu produk percontohan	Budi Santoso	80%	16/10/26	Berjalan
T-064	Perbaikan laporan harian pelanggan	Rizky Hidayat	5%	18/10/26	Berjalan
T-034	Verifikasi tindakan korektif	Dewi Lestari	35%	19/10/26	Berjalan
T-035	Siapkan berkas audit eksternal	Siti Rahmawati	10%	19/10/26	Berjalan
T-043	Susun materi kampanye	Dewi Lestari	30%	19/10/26	Berjalan
T-053	Konfigurasi segmentasi jaringan	Budi Santoso	45%	21/10/26	Berjalan
T-062	Evaluasi vendor logistik pengiriman	Maya Kusuma	10%	23/10/26	Berjalan
T-055	Uji kecepatan dan jangkauan	Andi Pratama	5%	25/10/26	Berjalan

+ 4 tugas berjalan lain di workbook (urut tenggat berikutnya).

Risiko dan butuh keputusan (5 butir; 4 butuh keputusan pimpinan)

ID	Tugas / pemilik	Status	Tenggat	Catatan dan keputusan yang diminta
T-030	Susun rencana tindakan korektif Budi Santoso	Terlambat	28/09/26 telat 11 hari	Terlambat karena revisi lingkup. **KEPUTUSAN:** perpanjang tenggat atau kurangi lingkup.
T-050	Rancang topologi baru Budi Santoso	Terlambat **BARU**	06/10/26 telat 3 hari	Terlambat; pemilik terbagi dengan proyek lain. **KEPUTUSAN:** tambah satu orang bantuan.
T-052	Pasang kabel lantai dua Andi Pratama	Terlambat **BARU**	07/10/26 telat 2 hari	Menunggu persetujuan anggaran. **KEPUTUSAN:** setujui tambahan anggaran atau tunda lingkup.
T-046	Undang mitra distributor Rizky Hidayat	Berisiko	13/10/26 4 hari lagi	Menunggu tugas sebelumnya selesai.
T-022	Pelatihan petugas layanan Rizky Hidayat	Berisiko	14/10/26 5 hari lagi	Menunggu pasokan dari pihak luar. **KEPUTUSAN:** pindah ke sumber alternatif atau tunda?

Perubahan sejak minggu lalu

- **Selesai:** 25 menjadi 33 (+8); tugas yang baru selesai: T-010, T-012, T-020, T-021, T-031, T-032, T-033, T-039.
- **Baru terlambat:** 2 tugas (T-050, T-052); keluar dari daftar terlambat: T-020, T-031, T-039.
- **Tugas baru ditambahkan:** 4 (T-061, T-062, T-063, T-064). Perubahan per status: Selesai +8, Berjalan +3, Berisiko -1, Terlambat -1, Belum Mulai -5.
- **Rata-rata kemajuan:** 65% (+4.8 poin dari minggu lalu).

Catatan kualitas data

Temuan validasi	Jumlah	ID	Penanganan di laporan
Persen melebihi 100	2	T-008, T-010	Dipotong menjadi 100
Tenggat kosong	2	T-023, T-063	Tidak dihitung terlambat/berisiko
Tenggat sebelum mulai	1	T-046	Dipakai apa adanya; perlu dikoreksi
Selesai tanpa tanggal selesai	1	T-039	Tidak masuk hitungan capaian minggu ini

6 temuan pada 6 dari 64 baris. Seluruh angka di laporan dihitung setelah penanganan di atas; baris tidak dibuang kecuali ID ganda.

Catatan: seluruh data pada edisi ini adalah data sintetis untuk peragaan, bukan data klien. Pembanding minggu lalu: catatan_minggu_01.xlsx.
